

【工事の状況】

発進立坑本体構築（コンクリート製の大きな筒を造っています）を施工中ですが、品質確認検査及びコンクリート表面仕上げを実施していたため、工程が遅れています。10月上旬から、発進立坑本体構築作業を再開します。

【今後の作業予定】

10月上旬から発進立坑の築造工事を再開し、2021年2月頃まで同じような作業（鉄筋組立、型枠組立、コンクリート打設、ケーソン圧入・掘削）を繰り返します。

作業時間は8時から17時が基本ですが、作業の進捗により多少の残業を行う場合があります。また、工程が遅れているため、日曜日以外は作業を行う予定です。

【騒音振動の発生について】

騒音について、型枠組立音、鉄筋組立音、掘削等に伴う建設機械の稼働音が引き続き発生しますが、東京都環境条例に則り、極力騒音騒音が小さくなる機械および工法を選定し、騒音振動を低減する対策を取り、騒音振動レベルを確認しながら作業を進めてまいります。

【近隣の皆さまへ】

工事に伴い工事用車両の通行、工事による騒音振動などにより、近隣の皆様にご迷惑をお掛けしております。皆様のご意見を伺いながら、極力ご迷惑をお掛けしないように工事を進めたいと考えています。お気づきの点がございましたら、ご連絡いただけますと助かります。

構築方法の概要



①鉄筋を組み立てます






②型枠を組み立てます




③型枠内にコンクリートを流し込みます



④型枠を解体したら次の工程に移ります

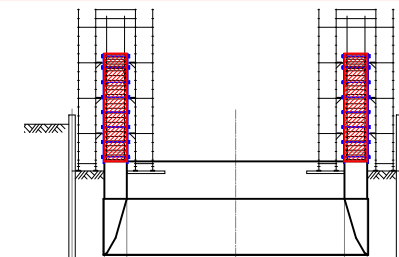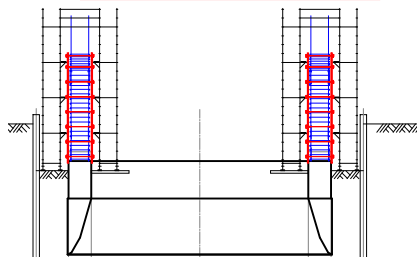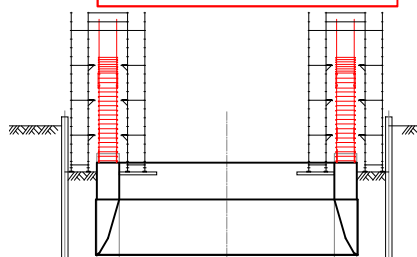

熊谷組キャラクター「くま所長」



工事についてお気づきの点などがございましたら、お手数をお掛けしますが下記までご連絡下さい。

(株)熊谷組 東電北多摩シールド作業所 TEL：042-352-4153、FAX：042-365-9152（担当：黒石、佐藤）
