

## 【工事の現況及び今後の予定】

シールドトンネル関係工事は、7月15日（大安）にシールドマシンによる掘進を開始し、7月28日に長さ5.7mのシールドマシンが全て地中に入り、1日あたり数メートル程度のゆっくりとしたペースで慎重に掘り進んでいます。

変電所内屋外土木工事は、構築工事に着手しており、鉄筋組立、型枠組立、コンクリート打設というサイクルで工事を進めています。


今後のシールドトンネル関係工事の予定は、9月6日頃までは昼間のみの作業とし、シールドマシンによるトンネル掘進を継続して行います。大型車両の通行は昼間のみとし、トレーラーとダンプトラックの合計で、一日当たり平均で10台程度走行する見込みです（9月7日以後は昼夜間で作業を行い、大型車両の通行は昼間のみ一日当たり平均で25台程度に増える予定です）。

今後の変電所内屋外土木工事は、構築工事を「足場組立～鉄筋組立～型枠組立～コンクリート打設～型枠解体～足場解体～埋戻し」のサイクルで、深い位置から浅い位置に向かって順番に行います。

極力、騒音や振動が小さくなる工具及び工法を選定して騒音振動を低減する対策を取り、騒音振動レベルを確認しながら作業を進めて参ります。

作業時間は8時から17時が基本ですが、作業の進捗により残業を行うことがあります。なお、工程が遅れているため、引き続き、日曜日以外は作業を行います。

お気付きの点がございましたら、下記連絡先までご連絡いただくと幸いです。

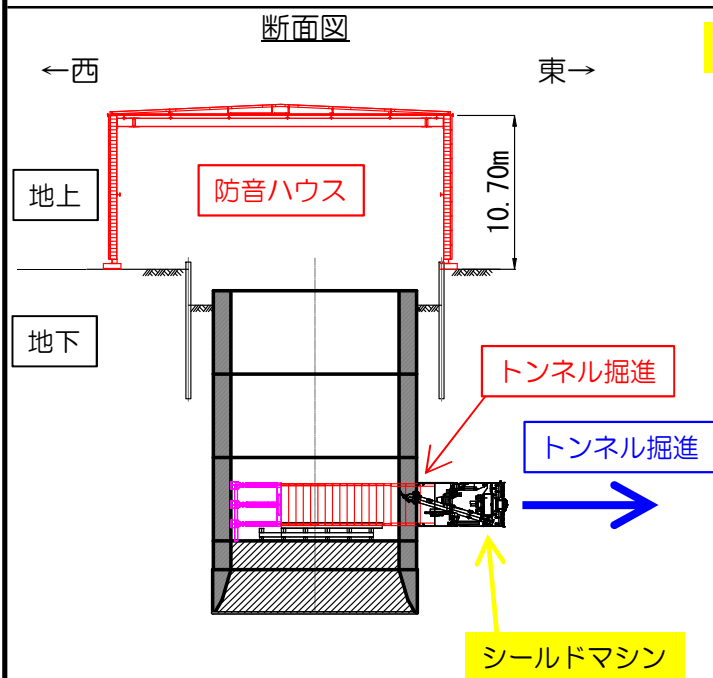


シールドマシン



地下22mで掘進中です。  
上の写真の白い部分が  
シールドマシンの外殻です。



熊谷組キャラクター「くま所長」

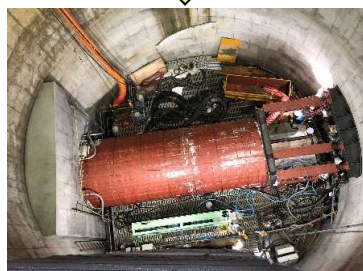


シールドマシン



iPC許諾番号：PL2007  
無断複製を禁止します

赤字：実施  
青字：予定



工事についてお気付きの点などがございましたら、お手数をお掛けしますが下記までご連絡下さい。

(株)熊谷組 東電北多摩シールド作業所 TEL：042-352-4153、FAX：042-365-9152（担当：黒石、村松、供田）
