

【工事の現況及び今後の予定】

シールドトンネル工事は、12月16日時点でスタート地点の発進立坑から約207m進んだ地点、変電所から市道「六中通り」へ出た箇所の道路下にシールドマシンがいます（トンネル内での労働災害発生を受け、安全対策を行っていたため工事が一か月ほど遅れています）。このまま「六中通り」の下を北に向かってトンネルを掘り進め、一日あたり12m程度進むことを想定しています。シールドマシンが通過する前後の地上部では、影響がないことを確認するために測量を行っています。

変電所内屋外土木工事は、弊社施工分については12月14日で終了しました。

大型車両の通行は昼間のみとし、トレーラーとダンプトラックの合計で、一日当たり平均で25台程度走行する見込みです。

地上作業では騒音や振動が小さくなる工具及び工法を選定して騒音振動を低減する対策を取り、騒音振動レベルを確認しながら作業を進めて参ります。

屋外での作業時間は8時から17時が基本ですが、作業の進捗により残業を行うことがあります（防音ハウス内での作業時間は、昼間が8時から17時、夜間が20時から翌朝5時を基本としています）。なお、工程が遅れているため、土曜日と祝日には作業を行います。

ホームページを開設しました。

シールドマシンの位置、シールドマシンの通過見込み時期、「工事だより」をご覧ください。

URL：<https://www.kitatama.info/>

→ QRコード



2021年も地域の皆様のご理解及びご協力により、工事を進めることができました。

ありがとうございました。


2022年が地域の皆様にとって良い一年となることを祈念いたします。

どうぞ良い年をお迎えください。

お気付きの点がございましたら、下記連絡先までご連絡いただくと幸いです。



スタートから160m地点付近
先端が左に曲がっています

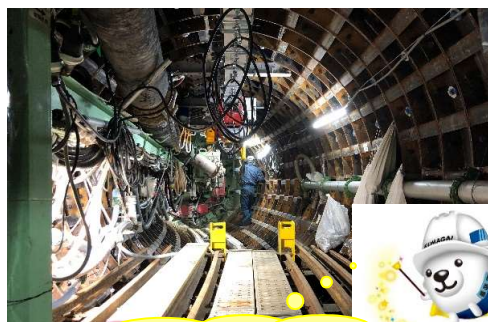


変電所正門付近地下
半径25mで曲がっています



iPC許諾番号：PL2007
無断複製を禁止します

赤字：実施
青字：予定



工事についてお気付きの点などがございましたら、お手数をお掛けしますが下記までご連絡下さい。

(株)熊谷組 東電北多摩シールド作業所 TEL：042-352-4153、FAX：042-365-9152（担当：黒石、村松、杉村）
