

【工事の現況及び今後の予定】

シールドトンネル工事は、10月25日時点でスタート地点の発進立坑から約165m進んだ変電所内の道路下にシールドマシンがいます。10月28日頃から変電所を出て、市道「六中通り」の下を北に向かってトンネルを掘り進め、一日あたり12m程度進むことを想定しています。シールドマシンが通過する前後の地上部では、影響がないことを確認するために測量を行います。

変電所内屋外土木工事は、構築工事（鉄筋組立、型枠組立、コンクリート打設、埋め戻しサイクルの繰り返し）が残り一回のコンクリート打設となりました。地上部での弊社施工分の土木工事は12月中旬頃に終わる見込みです。

大型車両の通行は昼間のみとし、トレーラーとダンプトラックの合計で、一日当たり平均で25台程度走行する見込みです。

極力、騒音や振動が小さくなる工具及び工法を選定して騒音振動を低減する対策を取り、騒音振動レベルを確認しながら作業を進めて参ります。


屋外での作業時間は8時から17時が基本ですが、作業の進捗により残業を行うことがあります（防音ハウス内での作業時間は、昼間が8時から17時、夜間が20時から翌朝5時を基本としています）。なお、工程が遅れているため、土曜日と祝日には作業を行います。

お気付きの点がございましたら、下記連絡先までご連絡いただくと幸いです。

トロッコで掘った土を運搬

クレーンで箱を吊り上げ
※土の量（重さ）を測定しています

発進立坑到着

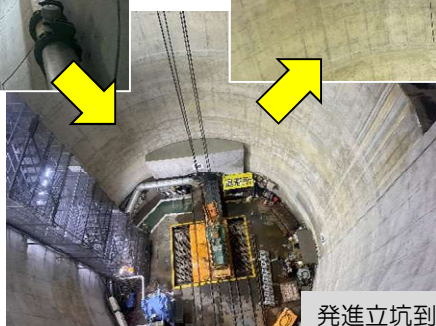

ダンプトラックに積んで搬出


マシン位置
165/2,264m

スタート

(c) INCREMENT P CORPORATION
許諾番号(内部利用): 9104457iPC許諾番号：PL2007
無断複製を禁止します赤字：実施
青字：予定

熊谷組キャラクター「くま所長」

トンネルを掘った土はトロッコで発進立坑（変電所）へ運搬し、クレーンで地上に吊上げた後、ダンプトラックに積んで搬出しています



工事についてお気付きの点などがございましたら、お手数をお掛けしますが下記までご連絡下さい。

(株)熊谷組 東電北多摩シールド作業所 TEL：042-352-4153、FAX：042-365-9152（担当：黒石、村松、供田）
