

【工事の状況】

2019年12月2日から北多摩変電所構内での現場作業に着手し、3か月が経過しました。
これまで作業ヤードの整備（伐採、整地、舗装）や土止め鋼矢板圧入、鋼矢板仮締切内の掘削を行ってきましたが、これから発進立坑本体構築（コンクリート製の大きな筒を造ります）に着手します。

【今後の作業予定】

3月2日から12月末にかけて、発進立坑の築造工事を継続して行います。主な作業内容は「①鉄筋組立、②型枠組立、③コンクリート打設、④コンクリート筒内掘削および圧入」となり、この工程を5回繰り返す予定です。

また、変電所構内に現場詰め所および作業員休憩所の仮設建物を設置します。

作業時間は8時から17時が基本ですが、作業の進捗により多少の残業を行う場合があります。

【騒音振動の発生について】

騒音について、型枠組立音、鉄筋組立音、掘削等に伴う建設機械の稼働音が発生しますが、東京都環境条例に則り、極力騒音騒音が小さくなる機械および工法を選定し、騒音振動を低減する対策を取り、騒音振動レベルを確認しながら作業を進めてまいります。

【近隣の皆さまへ】


工事が始まり、工事用車両の通行、工事による振動騒音などにより、近隣の皆様にご迷惑をお掛けしていないでしょうか？

皆様のご意見を伺いながら、極力ご迷惑をお掛けしないように工事を進めたいと考えています。お気づきの点がございましたら、ご連絡いただけますと助かります。

2023年6月の工事完成まで長いお付き合いになりますので、どうぞ宜しくお願いします。

平面図

断面図

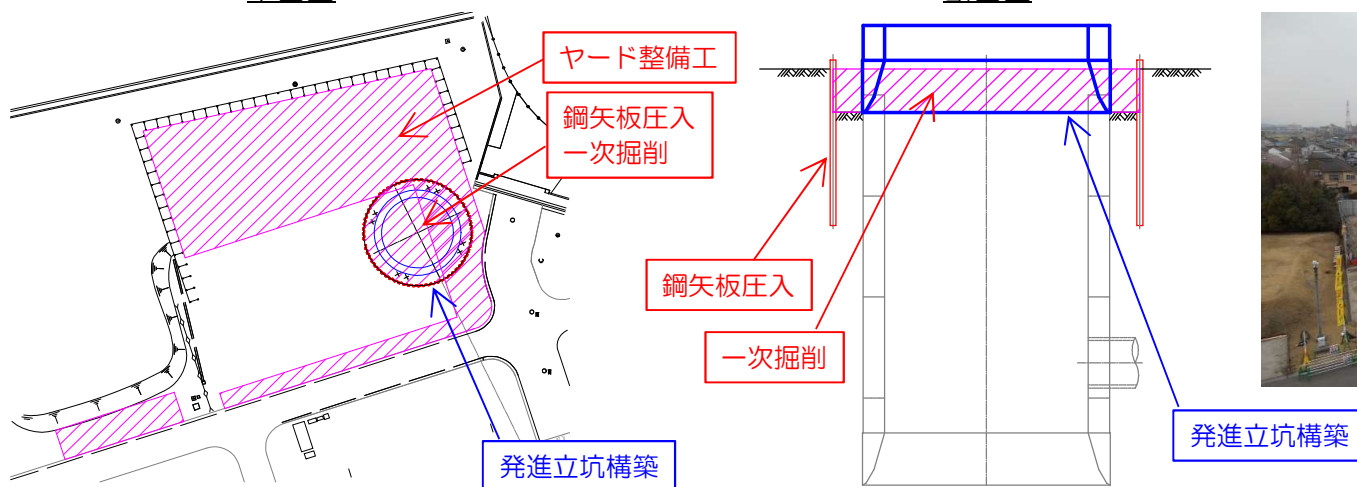

現場全景




凡例

赤字：実施

青字：予定

これから
宜しくお願いします

熊谷組キャラクター「くま所長」



工事についてお気づきの点などがございましたら、お手数をお掛けしますが下記までご連絡下さい。

(株)熊谷組 東電北多摩シールド作業所 TEL：042-352-4153、FAX：042-365-9152（担当：黒石、村松、佐藤、宮田、相馬、畠山）
