


【工事の現況及び今後の予定】


到達立坑の工事は現在、覆工板の下において立坑を作るための掘削工事、掘削した際に地盤が崩れないように土止めを設置する作業を並行しながら実施しています。

現在実施中の掘削工事につきましては、地上から約8.0mの深さまで掘削を完了しております。今後も引き続き掘削工事を夜間作業にて実施してまいります。（作業時間21時～翌6時）。また、掘削工事と並行して地下に配置しております埋設管の防護工事も行っております。

掘削・埋設防護工事中はクレーン重機のモーター音、使用工具などの金属音が発生します。低騒音機械を使用し作業を致しますが、お気付きの点がございましたら、下記連絡先までご連絡いただくと幸いです。

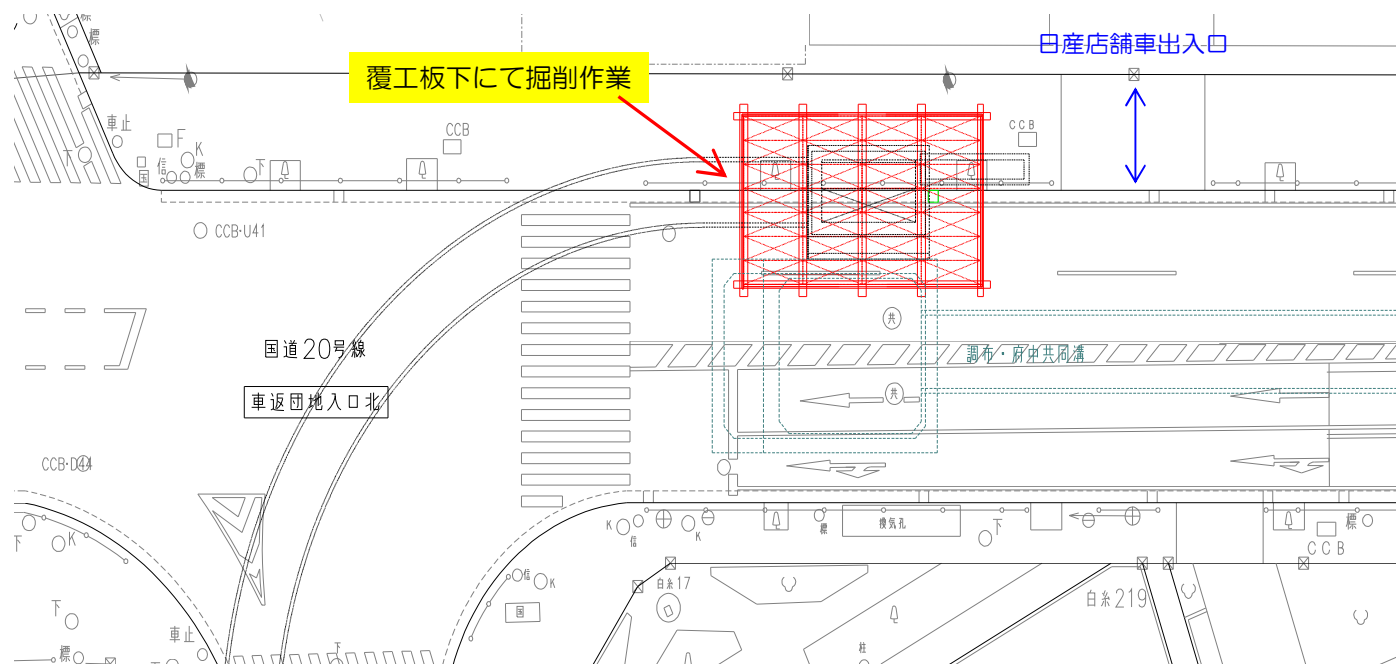

平面位置図

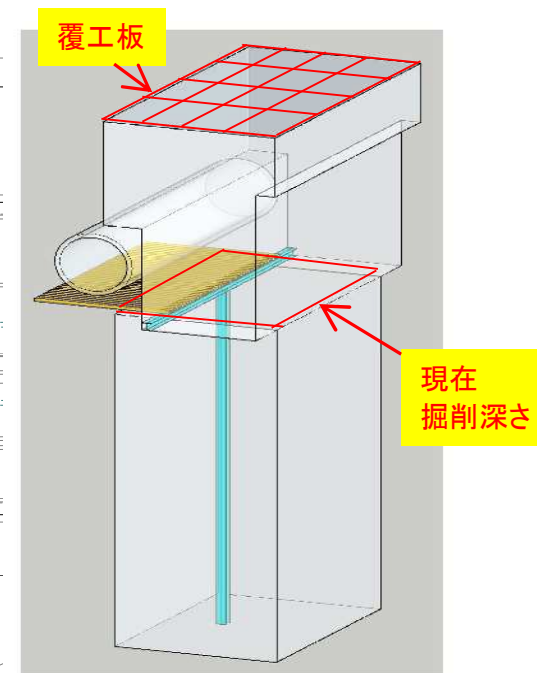

立面図



ホームページを開設しています。
工事概要・過去の「工事だより」をご覧ください。
URL：<https://www.kitatama.info/> → QRコード



工事についてお気付きの点などがございましたら、お手数をお掛けしますが下記までご連絡下さい。

(株)熊谷組 東電北多摩シールド作業所 TEL：042-352-4153、FAX：042-365-9152（担当：黒石、宮田、柴田）
